

H.XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



SOLICITUD DE LIBERACION DE RECURSO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DTFD
(FONDO III)

FACT. NO. 796

No. DE CUENTA: 0114206878

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE: MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS LOCALIDAD
AMADO NERVO EL CONDE


NO. DE OBRA: OP-SPL-F3-IR-003/2020

CLASIFICACION URBANIZACION

SUBCLASIFICACION PAVIMENTACION

MODALIDAD CONSTRUCCION

LOCALIDAD: AMADO NERVO



MONTO DEL CONTRATO CON IVA

3,244,796.41

ESTIMACION No. 2

IVA

TOTAL

23 DIC. 2020

909,451.87

145,512.30

1,054,964.17

AMORTIZACION DE 30% DE ANTICIPO

272,835.56

IVA

43,653.69 316,489.25

RET I.S.R.

2.5% ORG DE FISC. SUP.

2,273.63

2.5% CONTRALORIA MUNICIPAL

2,273.63 4,547.26


PENALIZACIONES

TOTAL DE DEDUCCIONES

321,036.51

TRANSFERIR

733,927.66



SOLICITO


ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

AUTORIZO

L.E.P. PATRICIA PEÑA PLANCARTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

VO.BO.

C.P. MARIA ELIZABETH GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL





24/12/2020 9:11:34 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

24/12/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114206878
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044320010015558040
Nombre corto:	MIRJAQ
Importe:	\$733,927.66
Fecha de operación:	24/12/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	OP FE IR 003 PAVIMENTO AMADO N
Referencia numérica:	241220
Clave de rastreo:	BNET01002012240031339004
Hora de Operación:	09:11:34
Folio de internet:	6950611045

Datos del beneficiario

Nombre: MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

796

No. de serie del CSD del emisor
00001000000411207646Fecha y Hora de emisión
2020-12-21T15:15:55Folio Fiscal
B7027738-43D1-11EB-BDF3-00155D014009**Emisor**

RFC: MCO0904035S1

Razón Social: MIRJA CONSTRUCCIONES SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44520

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-12-21T15:15:55

00001000000504587508

03 - Transferecia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSP850101N70

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO) REFERENTE A LA OBRA: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS, LOCALIDAD AMADO NERVO EN EL CONDE" CONTRATO OPSPL-F3-IR-003/2020 CON UN IMPORTE DE CONTRATO : \$ 3,244,796.41 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 41/100) INCLUYENDO IVA. ClaveProdServ - 72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	632,696.260000	632,696.260000

TOTAL EN LETRA:

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 66/100 MXN

Subtotal

632,696.26 MXN

IVAT 0.160000

101,231.401600 MXN

Total

733,927.66 MXN



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B7027738-43D1-11EB-BDF3-00155D014009|2020-12-21T15:15:55|B55fK0RQKN9YzHgyIC5aznJ56d3V16pvrW+eD3p0wHE22p38qe923G12LvDuBUY7U2LYoUllrJ9K5798IOMIKRDI207vMoxluH0BpytWNHv67WQanwNGiG7DEZDCnePIL0RMCMG98PcF2D08oG2oNKP6niXK5miP9MOlgM/3Xte7k1P1Wxz6Dz6nBeofezWHYPvO4t6Z5FmSyXPGkQXxtulrG SB0rUaAwEPISMOFomxLJGF3HOEEGtv1OgoKaHh0Gm74lsZMMFJSp6rbZFph4V1s+Jt6lNKAYrBvNojM7XsPH5ddh+FFW8JlehtCV+cPMw==||00001000000504587508||

Sello digital del emisor

E10GTQJjry|B55fK0RQKN9YzHgyIC5aznJ56d3V16pvrW+eD3p0wHE22p38qe923G12LvDuBUY7U2LYoUllrJ9K5798IOMIKRDI207vMoxluH0BpytWNHv67WQanwNGiG7DEZDCnePIL0RMCMG98PcF2D08oG2oNKP6niXK5miP9MOlgM/3Xte7k1P1Wxz6Dz6nBeofezWHYPvO4t6Z5FmSyXPGkQXxtulrG SB0rUaAwEPISMOFomxLJGF3HOEEGtv1OgoKaHh0Gm74lsZMMFJSp6rbZFph4V1s+Jt6lNKAYrBvNojM7XsPH5ddh+FFW8JlehtCV+cPMw==

Sello digital del SAT

sBJ5B1hd4zZ25sTqZtbkDEUkKe19zg90RxxGKpfg9SmmloFDi2M9JyY3pIOEu2oVgvrBUYK3OdxQ4rl5HggkSMkrejy4AutzejvleHydDZlgOP/rNjy9IYys4rRjprSy6YKHILULWk3bFFWLT3lrobUUUzkyHbd0xkGA6dCnpgGxA7BZPCLK/Mpff7vMr+pbK6iVO0aIrkV/xOD99aMqJERhGqe7go0ZHyj4ZgUu8RYStgOFKLaGgezRRmzXhaAp+MZs0CSmHh+852s1seLquPx4gEn/JIAr8QJyZBJE4HCIT2pKCBxxNPG1piHsOeCAPJlpwUS8WwZ4PlxA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.facturaelectronicaeimpresos.com

Página 1 de 1

POLIZA DE CHEQUE



H.XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA MPAL.
SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

24/12/2020

MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$ 733,927.66
--------------------------------	---------------

(SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS
66/100 MN)

CUENTA: 0114206878

SPEI:1045

CONCEPTO

PAGO DE ESTIMACION No. 2 DE LA OBRA OP-SPL-F3-IR-003/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO.

FIRMA DE RECIBIDO

DISTRIBUCION:

Cheque: Beneficiario

Original: Cuenta Pública

Copia: Contabilidad Ayuntamiento

[illegible]

SUMAS IGUALES

ORDEN DE PAGO




SAN PEDRO LAGUNA, S.
LEP. PATRICIA PEÑA PLANCARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZADO

Jose R. Rosales
C. JOSE ROQUE ROSALES TEODORO
SINDICO MUNICIPAL
V ° B

CP. MARIA ELIZABETH GONZALEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL
PAGADO

TEC. JOSÉ GERMAN JIMENEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISADO

TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITUD DE PAGO MÚLTIPLE

Total \$ 733,927.66
Descuentos \$ 0.00
NETO A PAGAR \$ 733,927.66

Secretaría/Dirección/Unidad Responsable Solicitante: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fondo Revolvente ☐Gastos a Comprobar ☐Pago a Proveedores ☐Viáticos ☐Apoyo Social ☐Pago de Lista de Raya ☐Otros ☒

Especificar:



POR LA CANTIDAD DE: \$ 733,927.66

(SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
VEINTISIETE PESOS 66/100 MN)

Por concepto: PAGO DE ESTIMACION No. 2 DE LA OBRA OP-SPL-F3-IR-003/2020 CONSTRUCCION

DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO.

San Pedro Lagunillas Nay. A 24 de Diciembre de 2020.

MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV

MCO0904035S1

NOMBRE

Reg. Fed. Caus.

FIRMA

En caso de efectuar algún convenio especial, méncionelo:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
OBRAS PUBLICAS	08	733,927.66	
	SUMA	\$ 733,927.66	

LEP. PATRICIA PENA PLANCARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZADOCP. MARIA ELIZABETH GONZALEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL
PAGADOING. GUILLERMO HÉREDIA MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
SOLICITADOC. JOSE GERMAN JIMÉNEZ GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISADO

Tratándose de gastos por comprobar, estos deberán ser comprobados dentro de los primeros 10 días a su pago por lo que autorizo a la Tesorería a descontarme de mis haberes si no cumplo en el plazo pactado de lo contrario serán descontados de la nomina de sueldo.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja de relacion:
Estimacion No.:

1 de 1
2 (DOS Y FINIQUITO)

lunes, 21 de diciembre de 2020

Periodo de Estimacion:

Fecha de Estimacion: martes, 20 de octubre de 2020

MIRIAO CONSTRUCCIONES

Contratista: MIRJAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS LOCALIDAD DE AMADO NERVO

Ubicación:

AMADO NERVO

Município:

SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT
MACION


RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

No.	Partidas:	Importes del presupuesto:	Importe / Estimacion
		\$	\$
SUMA HOJA 1	\$	909,451.87	145,512.30
SUMA HOJA 2	\$	909,451.87	1,054,964.17
			272,835.56
			43,653.69
			316,489.25
			2,273.63
			2,273.63
			321,036.51
			733,927.66

Estado Contable:	Obra:	I. V. A.	Total:
Asignacion:	\$ 2,797,238.28	\$ 447,558.12	\$ 3,244,796.40
Importe de estimacion:	\$ 909,451.87	\$ 145,512.30	\$ 1,054,964.17
Acumulado Anterior:	\$ 1,887,786.41	\$ 302,045.83	\$ 2,189,832.24
Acumulado a la Fecha:	\$ 2,797,238.28	\$ 447,558.12	\$ 3,244,796.40
Saldo por Ejercer:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Monto Exedente:			
Amortizacion del Anticipo:			
Asignacion:	\$ 839,171.48	\$ 134,267.44	\$ 973,438.92
Importe de estimacion:	\$ 272,835.56	\$ 43,653.69	\$ 316,489.25
Acumulado Anterior:	\$ 566,335.92	\$ 90,613.75	\$ 656,949.67
Acumulado a la Fecha:	\$ 839,171.48	\$ 134,267.44	\$ 973,438.92
Saldo por Ejercer:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Monto Exedente:			

ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. AARON ORTIZ ORTIZ



SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

DIRECCION DE OBRA PUBLICAS



MIRJAO CONSTRUCCIONES

OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS LOCALIDAD DE		
LOCALIDAD	AMADO NERVO	CONTRATISTA:	MIRJAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
MUNICIPIO	SAN PEDRO LAGUNILLAS	FECHA DE ELABORACION	21 de 2020
de	20 oct 2020 a 29 oct 2020	CONTRATO DE OBRA ESTATAL	OP-SPL-F3-IR-003/2020

ESTIMACIÓN No. 1		CONCEPTOS DE OBRA		PRECIO UNITARIO		CANTIDAD CONTRATADA		CANTIDAD ESTIMACION		IMPORTE A COBRAR	
No.	CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CONTRATADA	ACUM. ANT.	A COBRAR	ACUM. ACTUAL	IMPORTE A COBRAR	
		TOTAL				\$ 2,797,238.28		\$ 909,451.87			
01		I.- PRELIMINARES Y BASES TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		M2	\$ 9.50	\$ 1,484,795.06	4,260.0000	0.00	4,260.0000		
02		EXCAVACION CON EQUIPO EN CAJA, EN MATERIAL TIPO "B", EN SECO, DE 0.00 A 2.00M DE PROFUNDIDAD EN 60 CMS DE ESPESOR. INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU EJECUCION.		M3	\$ 125.00	\$ 3,582.00	3,582.0000	0.00	3,582.0000		
03		ACARREO Y CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES		M3	\$ 58.00	\$ 3,582.00	3,582.0000	0.00	3,582.0000		
04		BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20CM. DE ESPESOR, CON MEZCLA TEPEATE DE BANCO-BALASTRE, AL 90% PRUEBA PROCTOR STANDAR.		M3	\$ 262.98	\$ 2,975.00	2,975.0000	0.00	2,975.0000		
05		AJUSTE DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA LLEGAR AL NIVEL REQUERIDO.		ML	\$ 10.29	\$ 627.00	627.7900	0.00	627.7900		
06		II.- PAVIMENTOS SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA, MEZCLA CALIENTE CON MATERIALES PETREOS Y EMULSION SUPERESTABLE EN 7 CMS DE ESPESOR EXTENDIDA POR MEDIOS MECANICOS VACIANDOLA DE CAMION A EXTENDEDORA NIVELADORA Y COMPACTADA CON EQUIPO VIBRATORIO NEUMATICO Y VIBRO NORMAL, EL CONCEPTO INCLUYE LOS MATERIALES, LOS ACARREOS, EL EQUIPO Y MAQUINARIA NECESARIA		M2	\$ 297.82	\$ 1,268,713.20	1,353.1100	865,729.98	4,260.0000	865,729.98	
07		III.- LIMPIEZAS LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA		M2	\$ 9.50	\$ 43,730.02	-	43,721.89	4,602.3040	43,721.89	
		EL IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 1 ES POR \$			909,451.87					IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	
										\$ 909,451.87	


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

C. SERGIO DAVID MORA TORRES

ING. GUILLERMO MEREDITH MARQUEZ

SUPERVISOR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

DIRECCION DE OBRA PUBLICAS




MIRJAO CONSTRUCCIONES

NUMEROS GENERADORES

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS LOCALIDAD DE			
OBRA	SAN PEDRO LAGUNILLAS		
UBICACION	1		
NO. ESTIMACION	DEL	20/10/2020	AL 29/10/2020
PERIODO	MIRJAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
CONTRATISTA	OP-SPL-F3-1R-003/2020		
NO. CONTRATO			

CLAVE	NUM.	COD	PARTIDA CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		ACUMULADOS EST ANTERIOR	COBRADO ESTA ESTIMACION
					PROYECTO	GENERADO		
06			SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA, MEZCLA CALIENTE CON MATERIALES PETREOS Y EMULSION SUPERESTABLE EN 7 CMS DE ESPESOR EXTENDIDA POR MEDIOS MECANICOS VACIANDOLA DE CAMION A EXTENDIDORA NIVELADORA Y COMPACTADA CON EQUIPO VIBRATORIO NEUMATICO Y VIBRO NORMAL. EL CONCEPTO INCLUYE LOS MATERIALES.	M2	4260.72	1,353.11		1,353.11
UBICACION	CADAENAMIENTO	DISTANCIA	ANCHO	(L1 + L2) / 2	VOL	ACUMULADO	OBSERVACIONES / NOTAS:	
	0+000.00	15.300	15.300	15.30	163.710	163.71		
	0+010.70	10.70	15.300	14.65	136.245	299.96		
	0+020.00	9.30	14.000	14.00	280.000	579.96		
	0+040.00	20.00	14.000	14.00	280.000	859.96		
	0+060.00	20.00	14.000	14.00	280.000	1,139.96		
	0+080.00	20.00	14.000	14.00	280.000	1,353.11		
	0+094.55	14.55	15.300	14.65	213.158	1,353.11		
	0+101.70	7.15	15.300	15.30	109.395	1,462.51		
	0+120.00	18.30	14.000	14.65	268.095	1,730.60		
	0+140.00	20.00	14.000	14.00	280.000	2,010.60		
	0+160.00	20.00	14.000	14.00	280.000	2,290.60		
	0+180.00	20.00	14.000	14.00	280.000	2,570.60		
	0+184.25	4.25	15.300	14.65	62.263	2,632.87		
	0+196.40	12.15	15.300	15.30	185.895	2,818.76		
	0+200.00	3.60	14.000	14.65	52.740	2,871.50		
	0+220.00	20.00	14.000	14.00	280.000	3,151.50		
	0+240.00	20.00	14.000	14.00	280.000	3,431.50		
	0+260.00	20.00	14.000	14.00	280.000	3,711.50		
	0+280.00	20.00	14.000	14.00	280.000	3,991.50		
	0+280.75	0.75	15.300	14.65	10.988	4,002.49		
	0+287.65	6.90	16.870	16.09	110.987	4,113.47		

ING. GUILLERMO GUERRA MARQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C. SERGIO DAVID MORA TORRES SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	MIRJAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA
---	---	---



SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT

DIRECCION DE OBRA PUBLICAS



MIRJAO CONSTRUCCIONES

NUMEROS GENERADORES

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS LOCALIDAD DE

SAN PEDRO LAGUNILLAS

UBICACION

NO. ESTIMACION

PERIODO

CONTRATISTA

NO. CONTRATO

29/10/2020

AL

MIRJAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

OP-SPL-F3-IR-003/2020

CLAVE			PARTIDA CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		ACUMULADOS EST ANTERIOR	COBRADO ESTA ESTIMACION
NUM.	COD	PROYECTO			GENERADO			
07	#REF!			M2	4603.16	4,603.16		4,603.16
UBICACION		CADENAMIENTO	DISTANCIA	ANCHO	(L1 + L2) /2	VOL	ACUMULADO	OBSERVACIONES / NOTAS:
0+000.00			-	16.500				
0+010.70			10.70	16.000	16.25	173.875	173.88	
0+094.55			83.85	16.000	16.00	1,341.600	1,515.48	
0+101.70			7.15	16.000	16.00	114.400	1,629.88	
0+184.25			82.55	16.000	16.00	1,320.800	2,950.68	
0+196.40			12.15	16.000	16.00	194.400	3,145.08	
0+280.75			84.35	16.070	16.04	1,352.552	4,497.63	
0+287.65			6.90	15.110	15.59	107.571	4,580.00	
0+300.70			13.05	13.090	14.10	184.005	4,603.16	

ING. JUAN CARLOS MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. SERGIO DAVID MORA TORRES
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JAVON ORTIZ ORTIZ
CONTRATISTA







**SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT**

DIRECCION DE OBRA PUBLICAS



MIRJAQ CONSTRUCCIONES


NUMEROS GENERADORES			
OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS LOCALIDAD DE		
UBICACION	SAN PEDRO LAGUNILLAS		
NO. ESTIMACION	1		
PERIODO	DEL	20/10/2020	AL 29/10/2020
CONTRATISTA	MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
NO. CONTRATO	OP-SPL-F3-IR-003/2020		

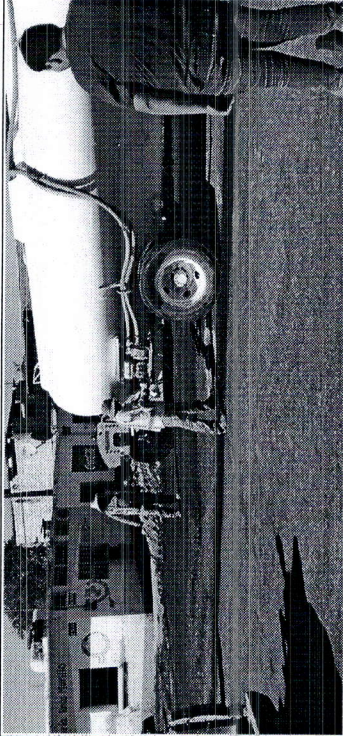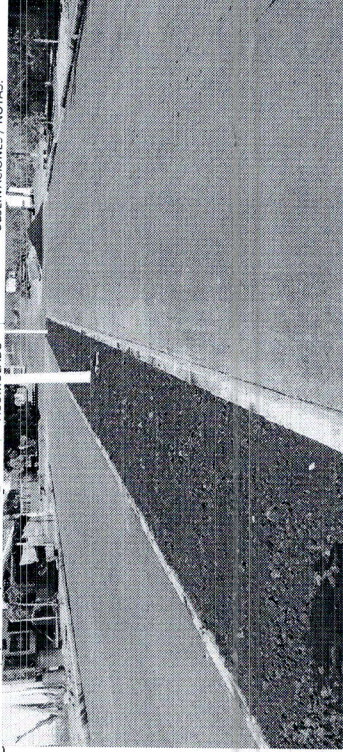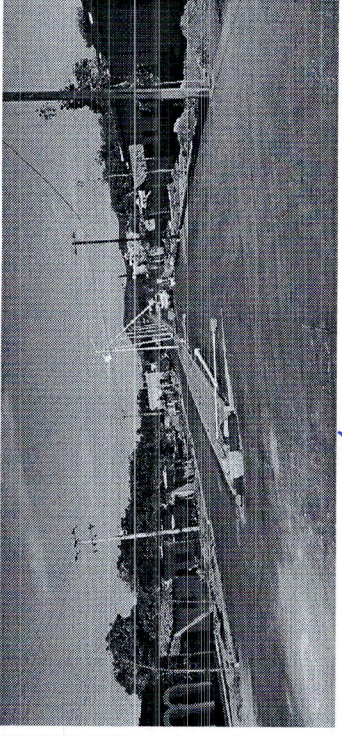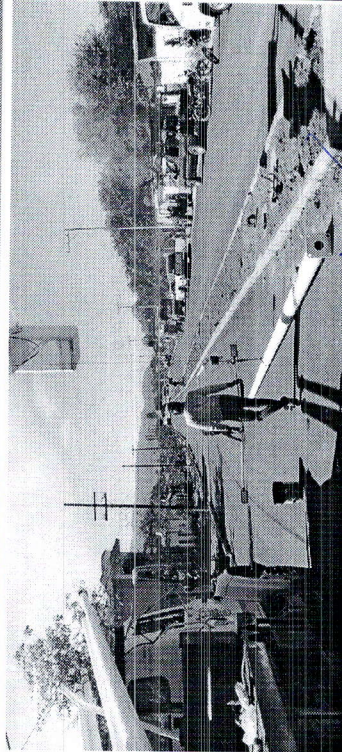UBICACION	CADENAMIENTO	AREA1	(A.1 + A.2) / 2	VOL	ACUMULADO	OBSERVACIONES / NOTAS
						
						

ING. GUERRERO FREDIA MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. SERGIO DAVID MORA TORRES
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. AARON ORTIZ ORTIZ
CONTRATISTA









**SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT**

DIRECCION DE OBRA PUBLICAS



MIRJAQ CONSTRUCCIONES


NUMEROS GENERADORES			
OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS		
UBICACION	1		
NO. ESTIMACION	DEL	20/10/2020	AL 29/10/2020
PERIODO	MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
CONTRATISTA	OP-SPL-F3-IR-003/2020		
NO. CONTRATO			

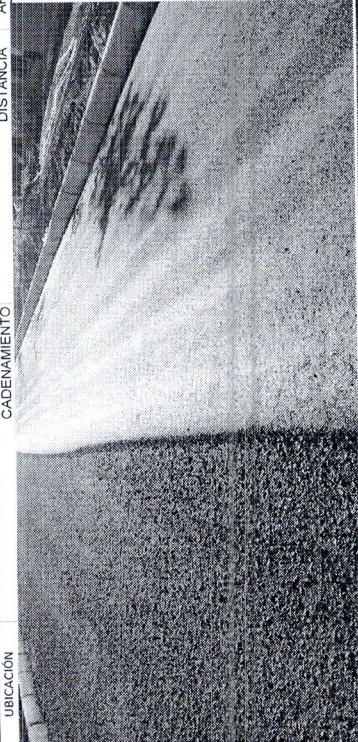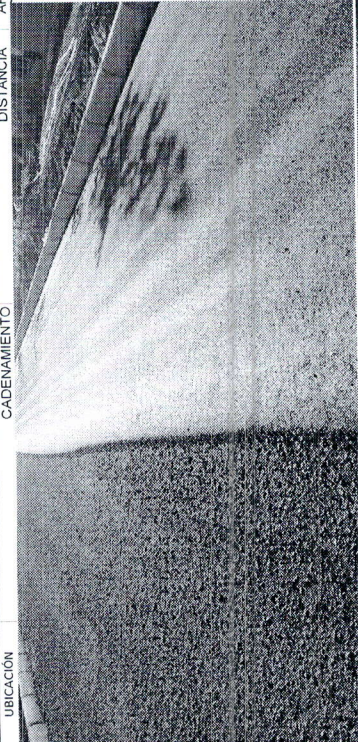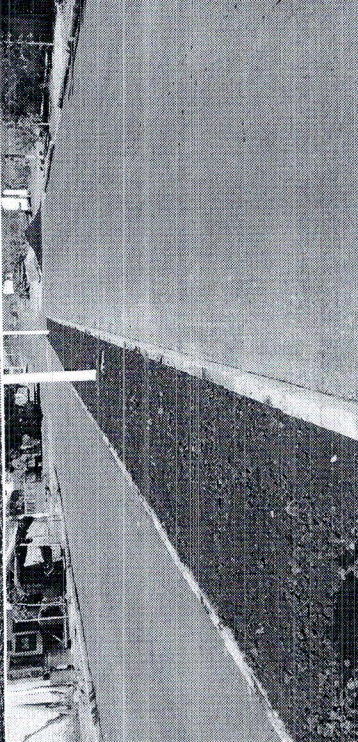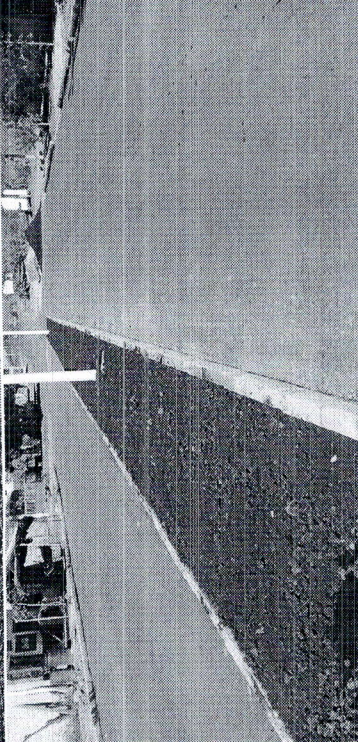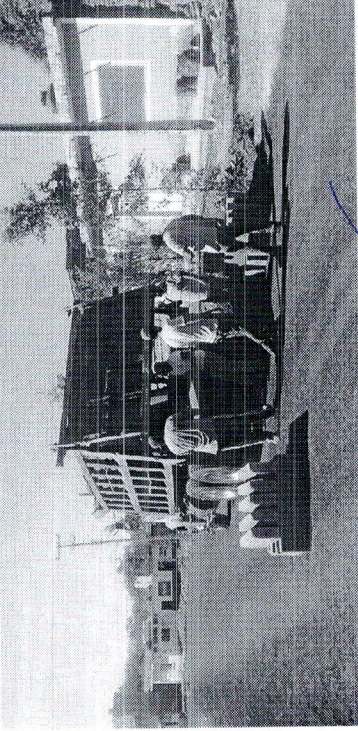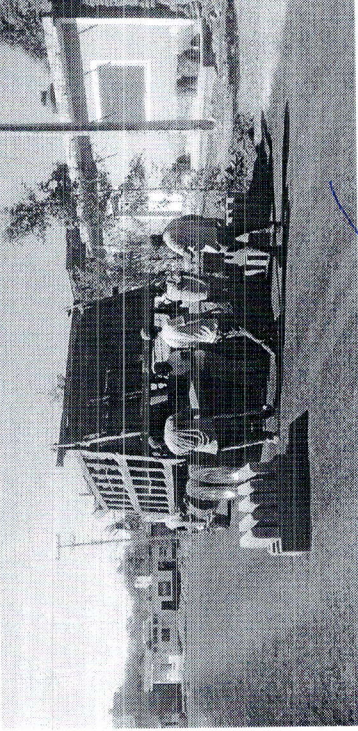UBICACION	CADENAMIENTO	DISTANCIA	AREA1	AREA2	VOL	ACUMULADO	OBSERVACIONES / NOTAS:
							
							
							
							

ING. GUILLERMO FERRER VARGAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
--

C. SERGIO DAVID MORA TORRES SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALBERTO ORTIZ CONTRATISTA






SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT

DIRECCION DE OBRA PUBLICAS



MIRJAQ CONSTRUCCIONES


NUMEROS GENERADORES			
OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS LOCALIDAD DE		
UBICACION	SAN PEDRO LAGUNILLAS		
NO. ESTIMACION	1		
PERIODO	DEL 20/10/2020	AL 29/10/2020	
CONTRATISTA	MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
NO. CONTRATO	OP-SPL-F3-IR-003/2020		

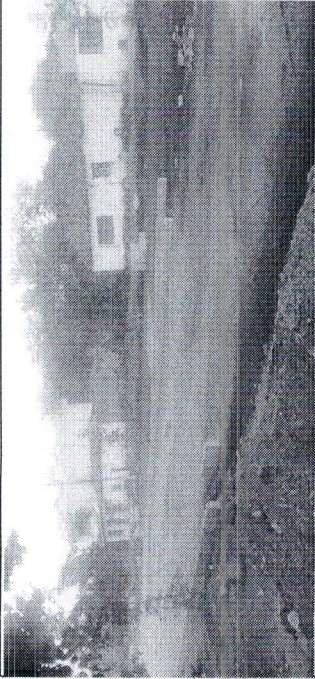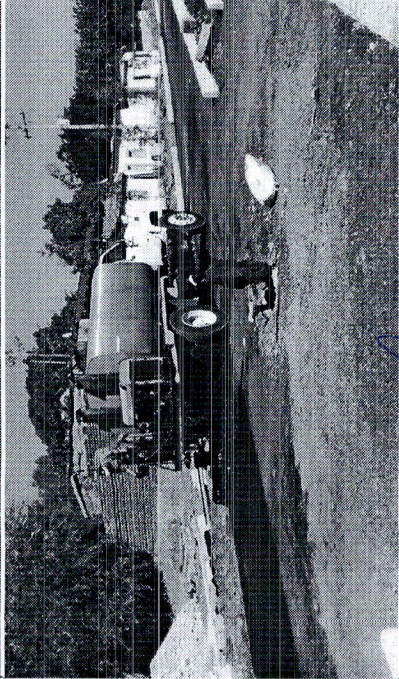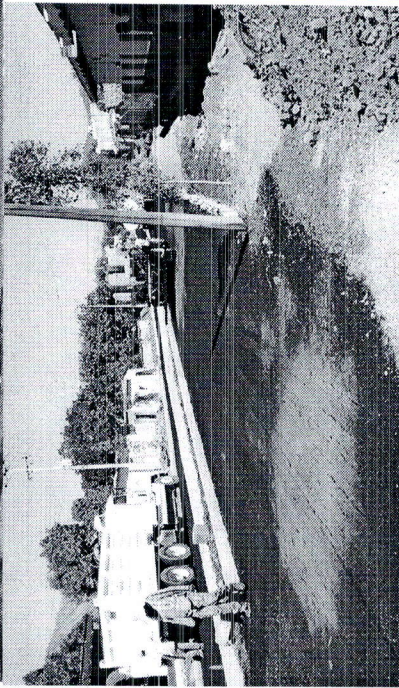UBICACION	CADENAMIENTO	DISTANCIA	AREA1	(A 1 + A 2) / 2	VOL	ACUMULADO	OBSERVACIONES / NOTAS:
   							

ING. GUILLERMO FERRER MARQUEZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. SERGIO DAVID MORA TORRES
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. AARON ORTIZ ORTIZ
CONTRATISTA



SAN PEDRO LAGUNILLAS

NAYARIT



DIRECCION DE OBRA PUBLICAS



MIRJAG CONSTRUCCIONES

NUMEROS GENERADORES			
OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN PEDRO LAGUNILLAS LOCALIDAD DE		
UBICACION	SAN PEDRO LAGUNILLAS		
NO. ESTIMACION	1		
PERIODO	DEL	20/10/2020	AL 29/10/2020
CONTRATISTA	MIRJAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
NO. CONTRATO	OP-SPL-F3-IR-003/2020		

UBICACION	CADENAMIENTO	DISTANCIA	AREA1	AREA2	VOL	ACUMULADO	OBSERVACIONES / NOTAS:
-----------	--------------	-----------	-------	-------	-----	-----------	------------------------

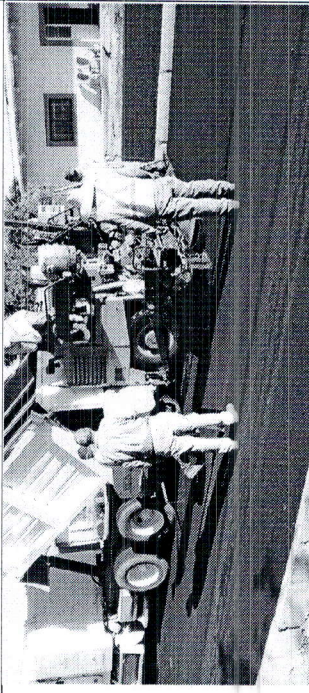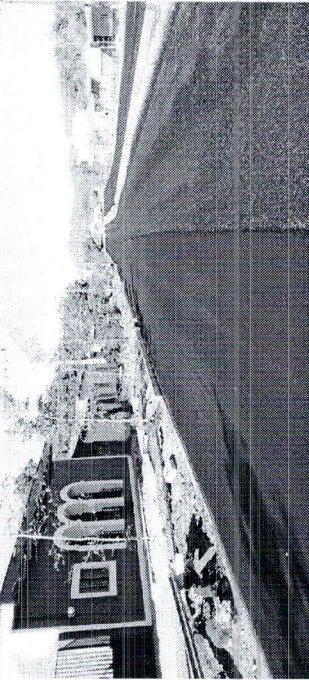

ING. SAMUEL RO HEREDIA MARQUEZ	CONTRATISTA
--------------------------------	-------------

C. SERGIO DAVID MORA TORRES	CONTRATISTA
-----------------------------	-------------

ING. JAVIER ORTIZ ORTIZ	CONTRATISTA
-------------------------	-------------

