

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS
OFICIO: MSPL/XLIII-A/OP-6.1/083
EXPEDIENTE: 01/2026

Asunto: **Reporte de Actividades Mensual SIESPL**

San Pedro Lagunillas; Nayarit, a 08 de mayo del 2026

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN DE
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
PRESENTE.

AT'N
LIC. SALVADOR GONZÁLEZ CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XLIII AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT


En contestación a su oficio número MSPL/XLIIIA/IMPLAN1.1/059 recibido el día 30 de abril del 2026 de asunto: "Recordatorio de solicitud de SIESPL" donde en relación al art. 65 Fracción VIII de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, al Art. 17, Art 5 fracción IV y IX del Acuerdo de Creación de Instituto Municipal de Planeación de San Pedro Lagunillas y a la Quinta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de dicho Instituto, nos solicita el Reporte del Sistema Estadístico de San Pedro Lagunillas (SIESPL) correspondiente al mes de **abril del 2026**, al respecto adjunto al presente el **Reporte de actividades mensuales del mes de abril del presente de la Dirección de Obras Publicas** compuesto por los siguientes formatos debidamente requisitados:

- Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1).
- Reporte de Actividades Más Relevantes (SIESPL 2).
- Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3).

Así mismo se le informa que los anteriores formatos ya han sido cargados en formato PDF y EXCEL en la plataforma Classroom.

En espera de dar haber cumplido en tiempo y forma con lo solicitado, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C.c.p. ARCHIVO
JJSP/mgsm



SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES:

ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DEL 2026

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERÍODO	OBSERVACIONES
6.4 ó 5.11 ó 5.14	Informe al OIC de empresas contratistas adjudicadas e importes contratados durante el mes inmediato anterior.	Dirección de Obras Públicas	Oficio	1	4	Se elaboró un oficio al Contralor Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, donde se le informa sobre los importes contratados y las empresas contratistas adjudicadas durante el mes anterior (de marzo del 2026).
4.1.2.15	Combustible para las máquinas y vehículos de la Dirección de Obras Públicas.	Supervisión de Obra Pública	Requisición	5	25	Se solicitó combustible para las máquinas Motoconformadora, Retroexcavadora y camiones volteo de 7m3 y de 14m3, así como también para los 2 vehículos de Obras Públicas, y se complementaron con evidencia fotográfica y bitácoras. Así mismo se envió personal de Obras Púb. por el combustible a la gasolinera para el suministro del equipo.
2.0, 3.0, 4.0	Abastecimiento de combustible periódicamente en el lugar de los trabajos a las máquinas y a los camiones volteo de la Dirección de Obras Públicas.	Supervisión de Obra Pública	acción de Abastecimiento	8	39	Se abasteció de combustible periódicamente en el lugar de los trabajos a las máquinas Motoconformadora, Retroexcavadora y a los camiones volteo de 7m3 y de 14m3 del Ayuntamiento. (8 acciones de abastecimiento a las 4 máquinas).
2.0, 3.0, 4.0	Llenado de bitácoras de combustible de las máquinas y vehículos de la Dirección de Obras Públicas respectivamente.	Supervisión de Obra Pública	Bitácoras	6	24	Se llenaron las bitácoras de combustible de las máquinas Motoconformadora, Retroexcavadora y de los camiones volteo de 7 m3 y de 14m3 del Ayuntamiento y de los 2 vehículos de la Dirección de Obras Públicas respectivamente.
2.0, 3.0, 4.0	Organización de las actividades del personal operativo de obras públicas y revisión de la maquinaria.	Supervisión de Obra Pública	Reunión	22	83	Diariamente se organizaron las actividades del personal operativo de obras públicas y se realizó la revisión de la maquinaria en operación.
2.0, 3.0, 4.0	Mejoramiento de caminos con maquinaria pesada	Supervisión de Obra Pública	Acción maquinaria	3	13	1.- Mejoramiento de camino al río Ameca en loc. Cuastecomate con la utilización de las maquinas Retroexcavadora y Motoconformadora y los camiones volteo de 7m3 Y 14m3. 2.- Mejoramiento del camino al panteón de la loc. de Cerro Pelón con las máquinas Motoconformadora y Retroexcavadora y el camión volteo de 7m3. 3.- Mejoramiento del camino al basurero en loc. San Pedro Lagunillas con la utilización de las maquinas Retroexcavadora y Motoconformadora y los camiones volteo de 7m3 Y 14m3.
2.0, 3.0, 4.0	Mejoramiento de calles con maquinaria pesada	Supervisión de Obra Pública	Acción maquinaria	0	0	
2.0, 3.0, 4.0	Mejoramiento de Unidad o Campo Deportivo, corral de toros lienzo charro, etc. con maquinaria pesada	Supervisión de Obra Pública	Acción maquinaria	0	0	
2.0, 3.0, 4.0	Trabajos varios con la utilización de Maquinaria pesada.	Supervisión de Obra Pública	Acción maquinaria	1	13	1.- Se apoyó a las Direcciones de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Protección Civil en sofocar un incendio en vertedero municipal, con la utilización de la maquinaria del Obras Públicas. 2.- Apoyo a Oromapas se aperturó una zanja para la instalación de un tramo de línea de drenaje en la Av. Terebintos y cruce con el arroyo en la loc. de San Pedro Lagunillas.
6.0	Supervisión de los trabajos realizados por la maquinaria del ayuntamiento	Supervisión de Obra Pública	Unidad de Trabajo y Amor al Pueblo	1	34	Se supervisaron los trabajos realizados por la maquinaria del Ayuntamiento, de mejoramiento del camino al río Ameca en loc. Cuastecomate, del camino al panteón de la loc. de Cerro Pelón y del camino al basurero en loc. San Pedro Lagunillas.

2024 08 MAYO 2026 2027

RECIBIDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

2024 08 MAYO 2026 2027

RECIBIDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN



H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MES: ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DEL 2026

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERÍODO	OBSERVACIONES
2.0, 3.0, 4.0	Reparación o mantenimiento de la maquinaria pesada y vehículos de obras públicas	Supervisión de Obra Pública	Servicio	3	13	1.- En varias ocasiones se llenaron los niveles de aceite de las maquina Motoconformadora y retroexcavadora. 2.- Se le cambio la banda del ventilador al camión volteo de 14m3, la cual presentaba daño grave debido a desgaste. 3.- Cambio del filtro primario y el filtro secundario de la máquina Retroexcavadora.
2.0, 3.0, 4.0	Trabajos variados de obras públicas	Dirección de Obras Públicas	Acción	0	4	
5.5	Publicación de la Convocatoria para el Padrón de Contratistas 2026.	Dirección de Obras Públicas	Publicación	0	1	
5.5	Padrón de Contratistas. Recepción, revisión, aprobación, observaciones y archivo de los documentos que los contratistas presentan para su inscripción y oficio de acepto o rechazo.	Supervisión de Obra Pública	Inscripción	1	1	Se inscribió una empresa al Padrón de Contratistas 2026.
2.3.7	Visita técnica (Servicios básicos).	Dirección Obras Pub.	Visita Técnica	2	2	1.- Se verificaron las condiciones actuales de la fosa séptica de la loc. de Cerro Pelón. 2.- Visita de campo al sitio probable para proyecto de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la loc. de Cerro Pelón.
2.0, 3.0, 4.0	Visita de campo/técnica a caminos y caminos saca cosechas.	Dirección Obras Pub.	Visita Técnica	0	1	
2.0, 3.0, 4.0	Visita técnica o de campo (Varios)	Dirección Obras Pub.	Visita Técnica	1	9	1.- Visita técnica para ver las condiciones actuales del puente peatonal que cruza el arroyo en la localidad de Amado Nervo.
2.3.7	Programa Anual de Obra Pública	Dirección Obras Pub.	Proceso/Documento	1	2	Se termino de elaborar la primera parte del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2026.
2.3.7	Levantamiento topográfico/Visita de Campo/técnica para la elaboración de proyecto de obra pública	Dirección de Obras Públicas	Levantamiento	1	6	1.-Levantamiento topográfico para la elaboración de un proyecto de Rehabilitación del Puente vehicular ubicado en la entra a la loc. de Las Guasimas.
2.3.7	Elaboración de anteproyectos y proyectos de obra pública	Dirección de Obras Públicas	Acción	8	10	1.- Se terminó el proyecto de la Construcción integral de calle Guerrero a base empedrado ahogado, incluyendo servicios, entre calles Morelos y Prolongación Cuauhtémoc en la loc. de San Pedro Lagunillas. 2.- Se terminó el proyecto de la Construcción integral de calle negrete a base de empedrado Ahogado, incluyendo servicios, entre calles Cuauhtémoc y guerrero en la loc. de San Pedro Lagunillas. 3.- Se terminó el proyecto de la Rehabilitación del Puente vehicular ubicado en la entra a la loc. de Las Guasimas. 4.- Se elaboró el anteproyecto y el proyecto de Construcción de puente alcantarilla tipo cajón en la loc. de Tepetitlic. 5.- Se elaboró el anteproyecto y el proyecto de la Construcción empedrado ahogado en calle Colosio entre la iglesia y poniente del pueblo, en la loc. de Cerro Pelón. 6.- Se elaboró el anteproyecto y el proyecto de la Construcción de empedrado ahogado de calle prolongación Colosio en la loc. de Cuastecomate. 7.- Se elaboró el anteproyecto y el proyecto de la Rehabilitación de puente peatonal en la loc. de Amado Nervo. 8.- Se elaboró el anteproyecto y el proyecto de la Rehabilitación de las 5 canchas para la primera sesión de cabildo.

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

MES:

ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DEL 2026

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
5.5, 5.11 y 6.2	Licitación de obra publica	Coordinador de Concursos, Contratos y Proyectos de Obras	Proceso	0	0	
2.3.7	Arranque de obra publica	Dirección de Obras Publicas	Evento	0	0	
2.3.7	Supervisión de obra pública contratada y Comunicación escrita con las empresas contratistas. Supervisión de trabajos de obras públicas.	Supervisión de Obra Pública	Visita de Obra	0	6	
2.3.7	Revisión y tramite para pago de Estimaciones de Obra Publica. (Incluye: Revisión de facturas y estimaciones, elaboración de liberación (solicitud de pago) y seguimiento del pago al contratista en Tesorería).	Dirección de Obras Publicas	Proceso	0	5	
2.3.7	Entrega Recepción de Obra Pública. (Incluye: Elaboración de Minuta, Acta de entrega recepción, Acta de entrega al organismo operador y acta de Finiquito y extinción de derechos)	Supervisión de Obra Pública	Actas	0	1	
2.3.7	Inauguración de obras. (Ejercicio fiscal 2025 o 2026).	Dirección Obras Pub.	Acto	0	3	
5.15	Apoyo a diferentes áreas de la Administración	Dirección de Obras Publicas	Apoyo	1	2	En apoyo a OROMAPAS se atendió una solicitud de revisión de la línea de drenaje debido a malos olores en la calle Guerrero esquina con Zaragoza en la loc. de San Pedro Lags.
5.4	Descarga y organización de fotos.	Dirección de Obras Publicas	Trabajo de oficina	3	10	Descarga y organización de fotos de las actividades de la Dirección de Obras Públicas correspondientes al mes de abril del 2026.
6.4	Revisión y complementación de requisiciones.	Dirección de Obras Publicas	Acción	10	35	Se complementaron documentos y fotografías faltantes de algunas requisiciones de combustible y material de obra.
6.4	Elaboración de solicitudes (requisiciones) de Material de oficina y de refacciones para el manto y/o reparación de la maquinaria pesada y volteos de la Dir. de Obras Púb.	Dirección de Obras Publicas	Requisición	1	37	Se elaboraron de diferentes solicitudes (requisiciones) de refacciones necesarias para el mantenimiento y/o reparación la maquinaria pesada y volteos de la Dirección de Obras Públicas, así como de servicios de alimentos, material de ferretería y casetas y se complementaron con evidencia fotográfica y bitácoras.
5.14	Avance trimestral del Programa Operativo Anual (POA)	Dirección de Obras Publicas	Avance POA	1	2	Se trabajó en el avance trimestral del Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección de Obras Públicas Municipales correspondiente al 1er. Trimestre del 2026, y se entregó a la DDS y al Contralor Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

MES: ABRIL

FECHA : 08 DE MAYO DEL 2026

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERÍODO	OBSERVACIONES
5.14	Reporte en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia del ITAI.	Dirección de Obras Publicas	Reporte ITAI	1	2	Se llenaron los formatos (numeral XXVIII a y y el numeral XXVII) del ITAI, sobre licitaciones de obra pública realizadas durante el 1er. Trimestre del 2026 y se subieron al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia del ITAI, además de que se informó mediante oficio de dicha captura a la Unidad de Enlace del Ayuntamiento.
5.14 ó 5.15	Reportes trimestrales de avance físico y financiero de obras ejecutadas (Avance de gestión financiera).	Dirección de Obras Publicas	Reporte trimestral	1	2	Se elaboraron los reportes trimestrales correspondiente al 1er. trimestre del ejercicio fiscal 2026, de las obras ejecutadas con recursos del Ramo 33; Fondo III 2025 y de las obras del Ramo 28; Participaciones Federales (Gasto Corriente 2025).
2.3.7	Recepción de solicitudes sobre construcción, ampliación o Servicios Basicos.	Dirección de Obras Publicas	Solicitud	0	2	
2.7.2	Recepción de solicitudes de la ciudadanía para mejoramiento o rehabilitación de Unidad, Cancha o Campo Deportivo.	Dirección de Obras Publicas	Solicitud	0	2	
4.0.1	Recepción de solicitudes de la ciudadanía sobre Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de calles.	Dirección de Obras Publicas	Solicitud	1	9	1.- Se recibió una solicitud de construcción de empedrado ahogado de la calle José Ceballos entre Nicolas Bravo y Carlos Montoya en la loc. de San Pedro Lags.
2.5.6	Recepción de solicitudes de la ciudadanía sobre Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de Plantel Educativo.	Dirección de Obras Publicas	Solicitud	0	2	
4.0.1	Recepción de solicitudes de la ciudadanía sobre Construcción, Rehabilitación o Mejoramiento de caminos y caminos sacacosechas.	Dirección de Obras Publicas	Solicitud	0	3	
5.10	Complementación de expedientes de obras pub. del ejercicio fiscal 2025	Dirección de Obras Publicas	Expediente	0	9	



Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Mensuales (SIESPL 1)

DEPENDENCIA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

PROGRAMA DEL PMD: **3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD**

MES:

ABRIL

FECHA : **08 DE MAYO DEL 2026**

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
5.10	Elaboración y complementación de expedientes de obra pública del 2026	Dirección de Obras Públicas	Obra	6	10	1.- Se trabajó en la elaboración del expediente de la Construcción empedrado ahogado en calle Colosio entre la iglesia y poniente del pueblo, en la loc. de Cerro Pelón. 2.- Se trabajó en la elaboración del expediente de la Construcción de empedrado ahogado de calle prolongación Colosio en la loc. de Cuastecomate. 3.- Se trabajó en la elaboración del expediente del proyecto de la Rehabilitación de puente peatonal en la loc. de Amado Nervo. 4.- Se trabajó en la elaboración del expediente del proyecto de Construcción de dormitorios para elementos de Seguridad Pública Mpa. 5.- Se trabajó en el expediente de la obra de Rehab. de puente alcantarilla tipo cajón en la loc. de Tepetitlic. 6.- Se trabajó en el expediente de la rehab. del alumbrado público de la plaza principal de la loc. de Milpillitas Bajas. Así mismo Se terminaron de elaborar los expedientes de: 1.- Construcción integral de calle Guerrero a base empedrado ahogado, incluyendo servicios, entre calles Cuauhtémoc y Prolongación Cuauhtémoc en la loc. de San Pedro Lagunillas. 2.- Construcción integral de calle negrete a base de empedrado Ahogado, incluyendo servicios, entre calles Cuauhtémoc y guerrero en la loc. de San Pedro Lagunillas. 3.- Rehabilitación del Puente vehicular ubicado en la loc. de Las Guasimas. Y 4.- Rehabilitación y/o mejoramiento de 5 canchales del municipio.
5.14 ó 5.15	Asistencia a reuniones y capacitaciones	Dirección de Obras Públicas	Reunión y/o capacitación	1	9	1.- En coordinación con el IMPLAN se llevó a cabo la reunión de Concertación de la obra de Rehabilitación del Puente vehicular ubicado al entrar en la loc. de Las Guasimas. 2.- Se asistió a una reunión de asamblea del comisariado para dar a conocer los requisitos que debe presentar el terreno e iniciar con la certeza jurídica del predio más apto para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.
2.5.3	Peritajes o Dictámenes por parte de la Dirección de Obras Públicas Mples.	Dirección de Obras Públicas	Proceso	4	4	Dictamen a expedientes técnicos de obra pública: 1.- Construcción de dormitorios para elementos de Seguridad Pública Mpa. 2.- Rehabilitación del Puente vehicular ubicado al entrar en la loc. de Las Guasimas. 3.- Rehabilitación de puente alcantarilla tipo cajón en la loc. de Tepetitlic. 4.- Rehabilitación del alumbrado público de la plaza principal de la loc. de Milpillitas Bajas.
2.3.1, 4, 5 y 7, 5.10	FONDO III; FAISMUN 2026	DOP	Acción	1	2	Se cargo en la plataforma SIFAIS el proyecto de la Rehabilitación del alumbrado público de la plaza principal en la loc. de Milpillitas Bajas.
5.14	Contestación a Aditorias.	Dirección de Obras Públicas	Acción	0	1	
2.0, 3.0, 4.0	Trabajo de oficina de oficina, incluye, archivar doc., contestación a oficios varios, Archivo, Inventario, elaboración de oficio-invitación, etc.	Dirección de Obras Públicas	Acción	3	19	1.- Se archivaron diferentes oficios entregados y recibidos, así como juegos de requisiciones. 2.- Se elaboró un oficio de solicitud a la Secretaría del Ayto. para presentar en la reunión de Cabildo la primera parte de la Propuesta del Programa Anual de Obras Públicas. 4.- Se llenaron formatos, se realizó un reporte fotografico, se localizaron los bienes muebles y se atendió a personal de Coordinación de Archivos y Activos Municipales para la revisión física de los bienes muebles de esta dirección

ELABORÓ

VALIDÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT

2024 - 2027

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Actividades Más Relevantes (SIESPL 2)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DEL PMD: 3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

MES: ABRIL

FECHA : 08 DE MAYO DEL 2026

No	Actividades mas relevantes
1	Trabajos de Maquinaria: Mejoramiento del camino al panteón de la loc. de Cerro Pelón, consistente en el corte, carga y acarreo del material desde el banco de extracción ubicado dentro del ejido hasta el sitio de los trabajos con apoyo de la maquinas Retroexcavadora y el camión volteo de 7m3, así mismo se llevaron a cabo los trabajos de corte y compensación de la superficie de rodamiento del camino saca cosechas con la finalidad de nivelar el camino, así como la excavación de cunetas, con el apoyo de la maquina Motoconformadora con el fin de conservar el camino y permitir un tránsito seguro, y confortable de los camiones, vehículos y de los productores en general que hacen uso del mismo.
2	Trabajos de Maquinaria: Mejoramiento de camino al río Ameca en la localidad de Cuastecomate, consistente en el corte, carga y acarreo del material desde el banco de extracción cercano a este camino hasta el sitio de los trabajos con apoyo de la maquinas Retroexcavadora y camiones volteo de 7m3 y 14m3, así mismo, se llevaron a cabo los trabajos de corte y compensación de la superficie de rodamiento del camino saca cosechas con la finalidad de nivelar el camino, así como la excavación de cunetas, con el apoyo de la maquina Motoconformadora con el fin de conservar el camino y permitir un tránsito seguro, y confortable de los camiones, vehículos y de los productores en general que hacen uso del mismo.
3	Trabajos de la maquinaria: Mejoramiento del camino al basurero en loc. San Pedro Lagunillas, consistente en el corte, carga y acarreo del material desde el banco de extracción ubicado dentro de la localidad hasta el sitio de los trabajos con apoyo de la maquinas Retroexcavadora y camiones volteo de 7m3 y 14m3, así mismo, se llevaron a cabo los trabajos de corte y compensación de la superficie de rodamiento del camino saca cosechas con la finalidad de nivelar el camino, así como la excavación de cunetas, con el apoyo de la maquina Motoconformadora con el fin de conservar el camino y permitir un tránsito seguro, y confortable de los camiones, vehículos y de los productores en general que hacen uso del mismo.
4	Trabajos de la maquinaria: Se apoyó a las Direcciones de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Protección Civil en sofocar un incendio en el vertedero municipal con la utilización de la maquina Retroexcavadora, donde se separó el material de basura incediado del resto susceptible a incendiarse a traves de una guardarraya formada con esta maquinaria.
5	Visita Técnica: Se verificaron las condiciones actuales de la fosa séptica de la loc. de Cerro Pelon, donde personal tecnico de la Dirección de Obras Públicas se reunió con las autoridades locales y se hizo presencia en el sitio actual de esta fosa para inspeccionar el estado de funcionalidad que guarda, con el objeto de proponer un proyecto de rehabilitación o nueva construcción.
6	Visita de campo: Visita al sitio probable para proyecto de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la loc. de Cerro Pelón. El personal tecnico de la Dirección de Obras Públicas y la Contraloría Municipal asistió a una asamblea del comisariado y posteriormente a inspeccionar una parcela posible a ser donada al Ayuntamiento para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
7	Visita técnica: El personal tecnico de la Dirección de Obras Públicas realizó una visita para ver las condiciones actuales del puente peatonal que cruza el arroyo en la localidad de Amado Nervo y proponer un proyecto de rehabilitación del mismo.
9	En coordinación con el IMPLAN se llevó a cabo la reunión de Concertación de la obra de Rehabilitación del Puente vehicular ubicado a la entrada del poblado de la loc. de Las Guasimas.

ELABORÓ
C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ
ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS





H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)



DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

MES:

ABRIL

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

FECHA :

08 DE MAYO DEL 2026



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

1

Trabajos de Maquinaria: Mejoramiento del camino al panteón de la loc. de Cerro Pelón con las máquinas Motoconformadora y Retroexcavadora y el camión volteo de 7m3

ELABORÓ

[Signature]

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ

[Signature]



H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO, SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES NAYARIT
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)



DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

MES:



FEBRERO

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

FECHA :

09 DE ABRIL DEL 2026

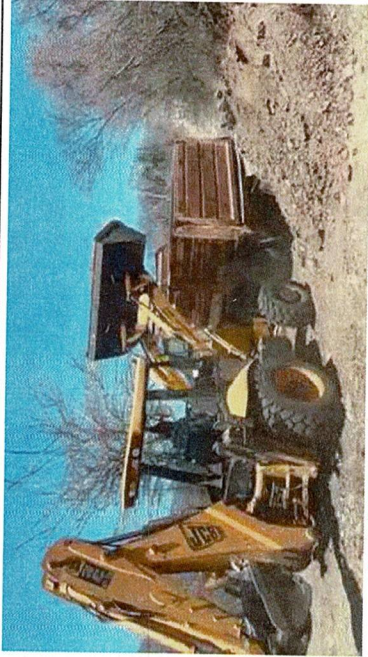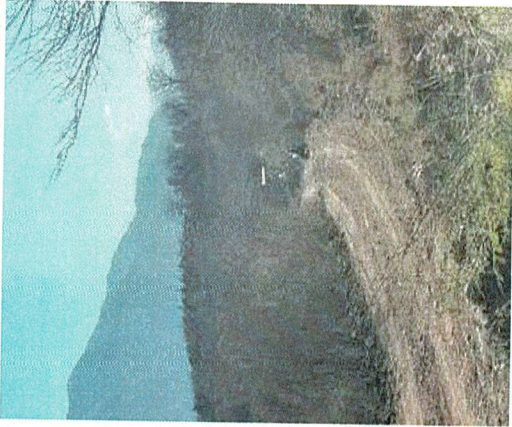BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

2

"Trabajos de la maquinaria: Mejoramiento de camino al rio Ameca en loc. Cuastecomate con la utilización de las máquinas Retroexcavadora y Motoconformadora y los camiones volteo de 7m3 Y 14m3.

ELABORÓ



C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESÚS SALAS PUJIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)



DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

MES:

FEBRERO

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

FECHA :

09 DE ABRIL DEL 2026

		
--	---	--

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

3	Trabajos de la maquinaria: Mejoramiento del camino al basurero en loc. San Pedro Lagunillas con la utilización de las maquinas Retroexcavadora y Motocombinadora y los camiones volteo de 7m3 Y 14m3.
---	---

ELABORÓ



C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO PEDRO LAGUNILLAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y ARIT

2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)



DEPENDENCIA:

MES:




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
FEBRERO

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

FECHA :

09 DE ABRIL DEL 2026

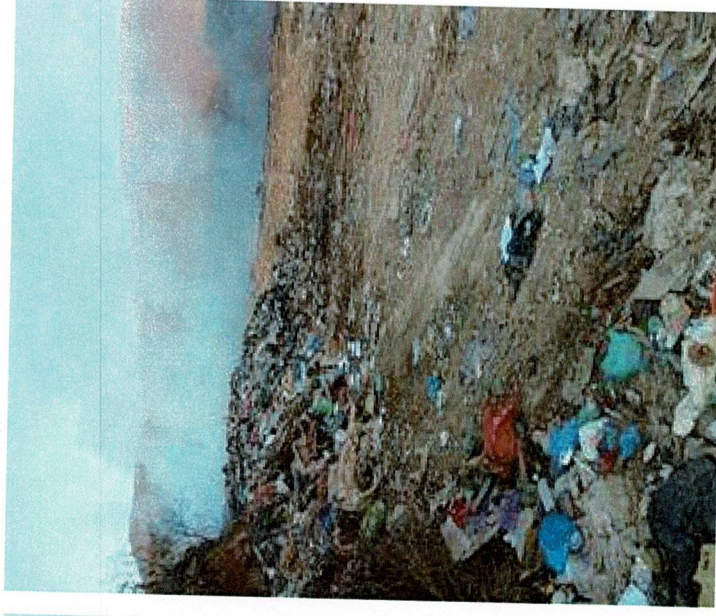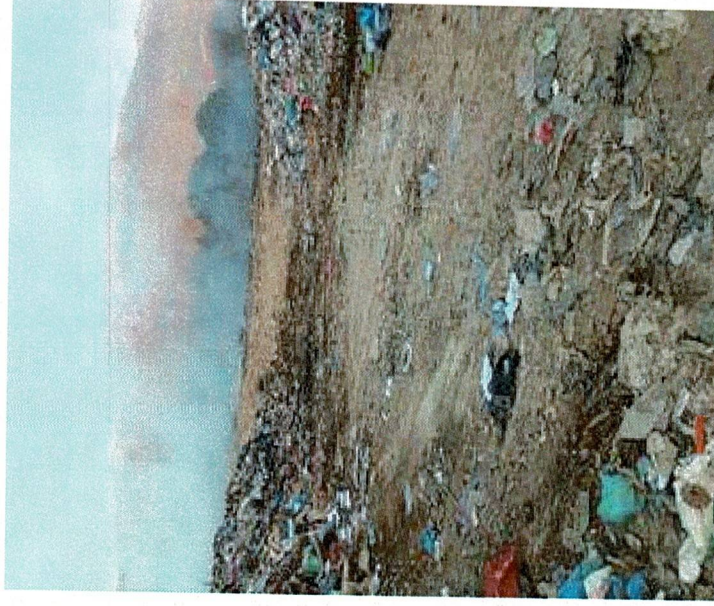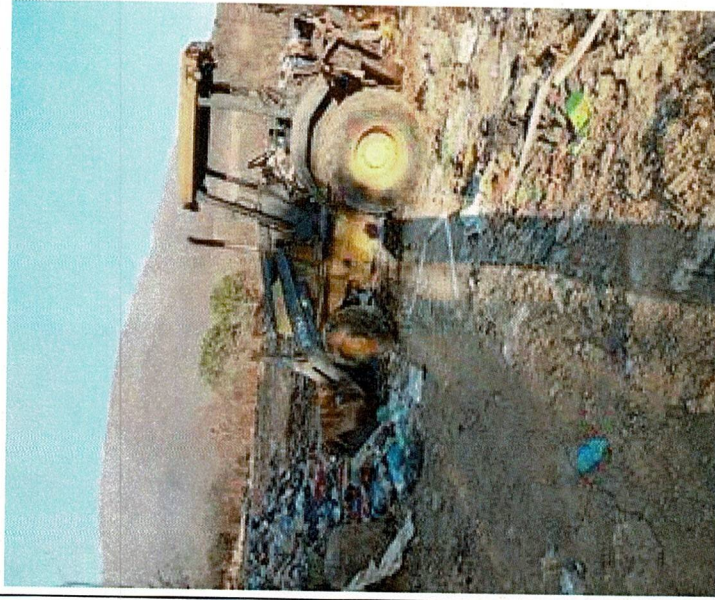

4

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

Trabajos de la maquinaria: Se apoyó a las Direcciones de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Protección Civil en sofocar un incendio en vertedero municipal, con la utilización de la maquinaria de las Obras Públicas.

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JOSÉ SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024 - 2027



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)



DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

MES:


FEBRERO

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

FECHA:

09 DE ABRIL DEL 2026

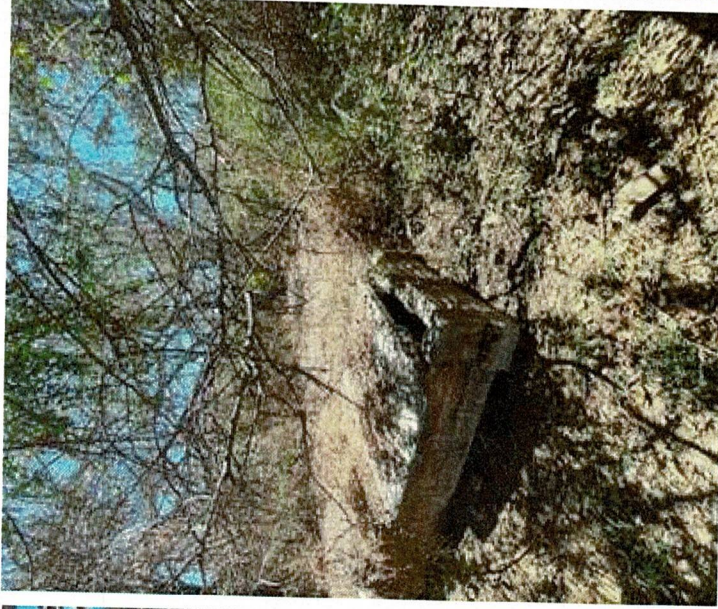

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

5

Visita Técnica: Se verificaron las condiciones actuales de la fosa séptica de la loc. de Cerro Pelon.

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LAGUNILLAS
NAYARIT
2024 - 2027



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)



DEPENDENCIA:

MES:





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
FEBRERO

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

FECHA:

09 DE ABRIL DEL 2026

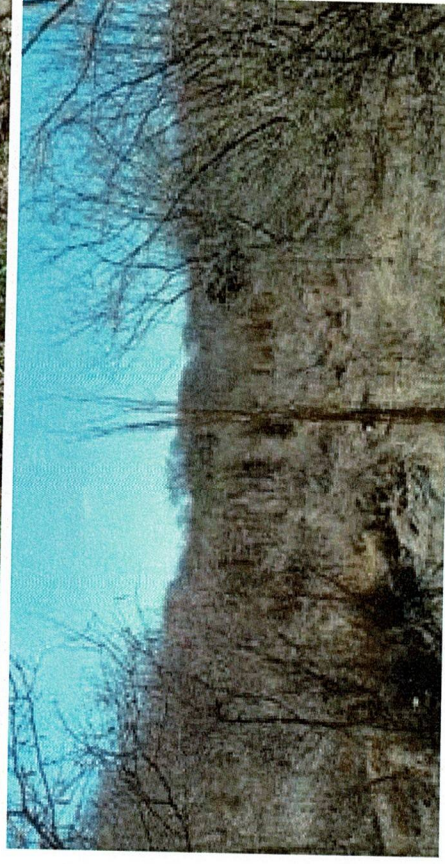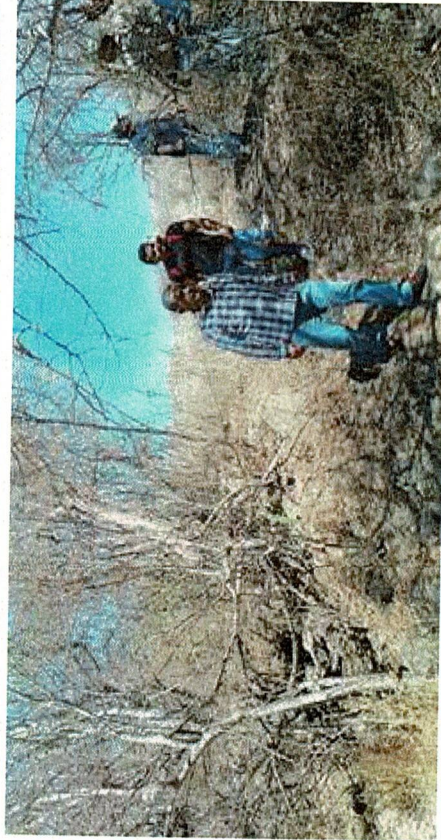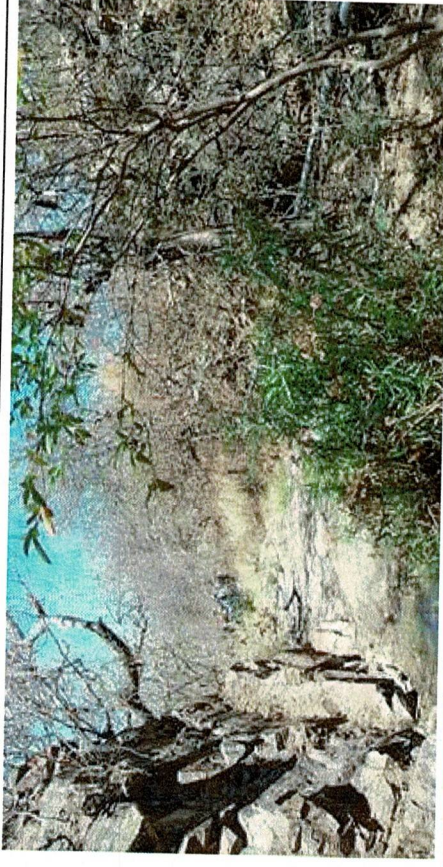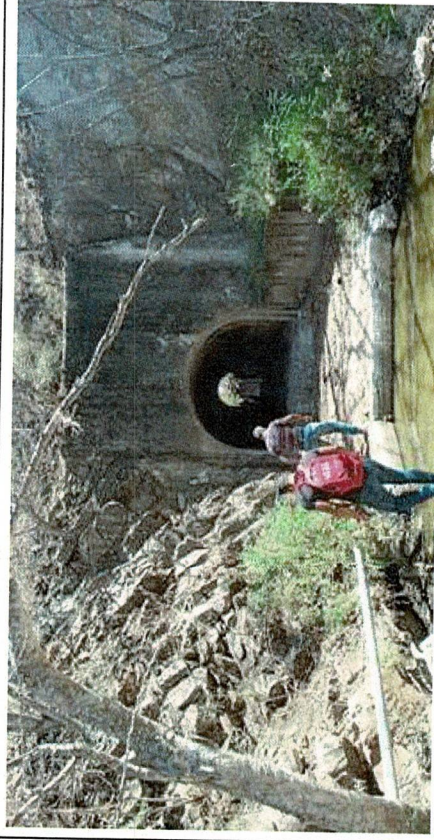

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

6

Visita de campo: Visita al sitio probable para proyecto de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la loc. de Cerro Pelón.

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE SANCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ

ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NAYARIT
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS





H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)



DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES





MES: FEBRERO

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

FECHA :

09 DE ABRIL DEL 2026

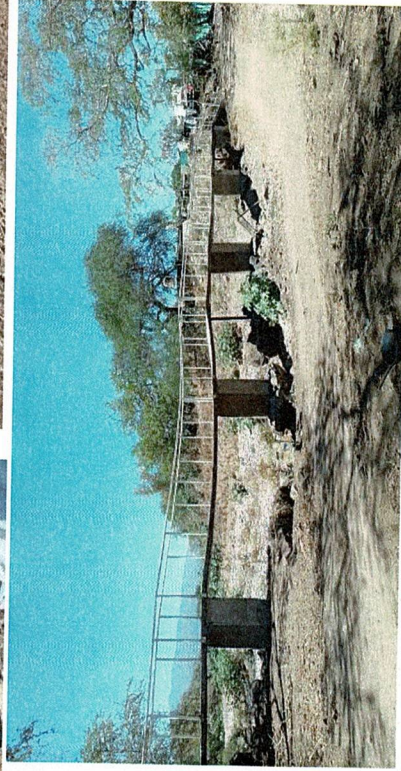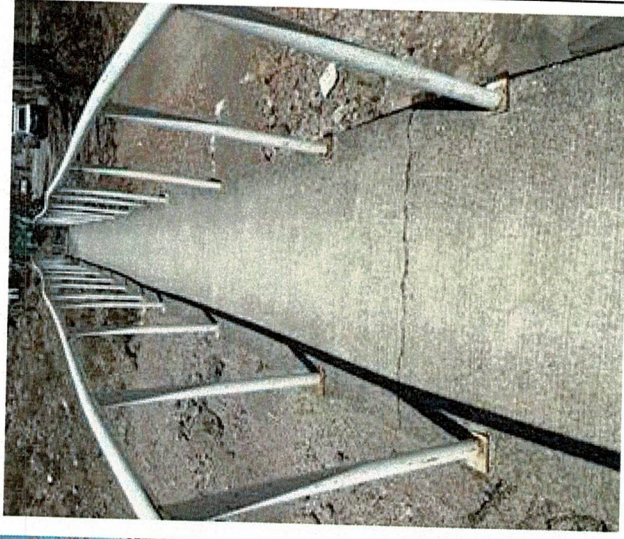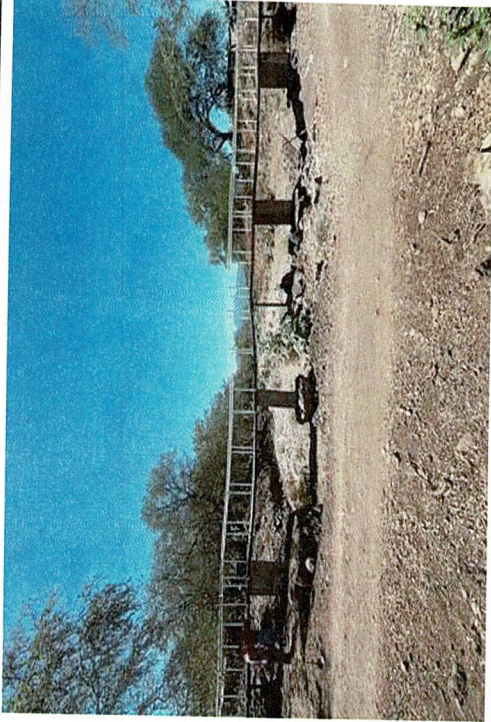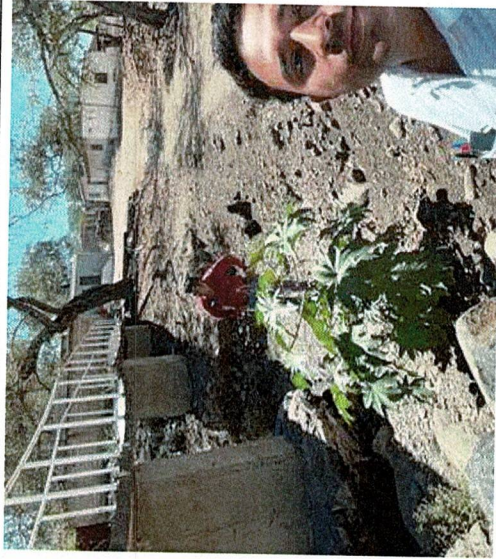

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

7 Visita técnica: para ver las condiciones actuales del puente peatonal que cruza el arroyo en la localidad de Amado Nervo.

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA

CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS

VALIDÓ



ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO N PEDRO LAGUNILLAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES NAYARIT
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA:

MES:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FEBRERO

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

FECHA:

09 DE ABRIL DEL 2026



BREVE DESCRIPCION DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

8 Mantenimiento de maquinaria: cambio la banda del ventilador al camión volteo de 14m3, la cual presentaba daño grave debido a desgaste.

ELABORÓ

[Signature]

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA
CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS

VALIDÓ

[Signature]
ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NAYARIT

DEPENDENCIA:

MES:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES




FEBRERO

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

FECHA:

09 DE ABRIL DEL 2026

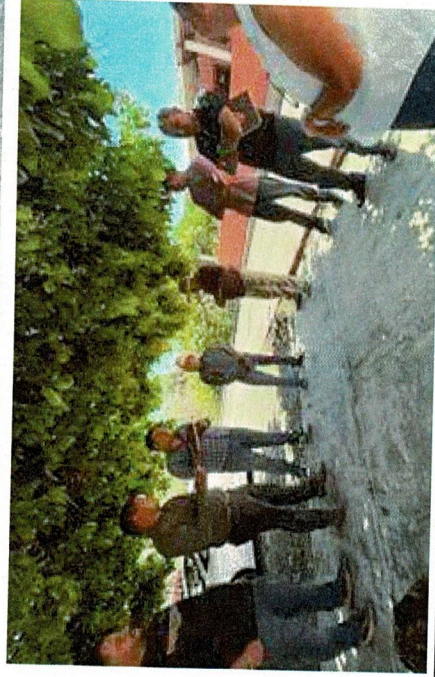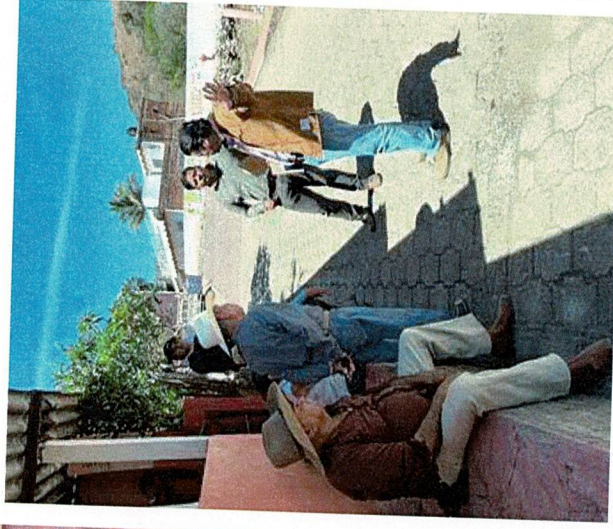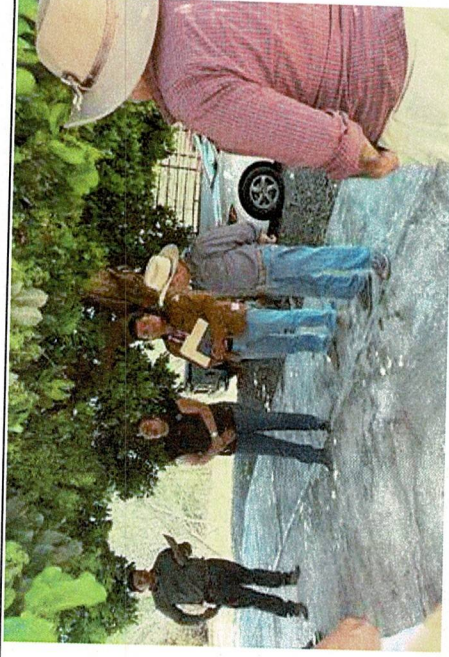

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

9

En coordinación con el IMPLAN se llevó a cabo la reunión de Concertación de la obra de Rehabilitación del Puente vehicular ubicado al entrar en la loc. de Las Olas.

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA

CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ

ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN PEDRO LAGUNILLAS

NAYARIT

2024 - 2027

OBRAS PÚBLICAS

H. XLIII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Reporte de Evidencias Fotográficas (SIESPL 3)

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

MES:



FEBRERO

PROGRAMA DEL PMD:

3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

FECHA:

09 DE ABRIL DEL 2026

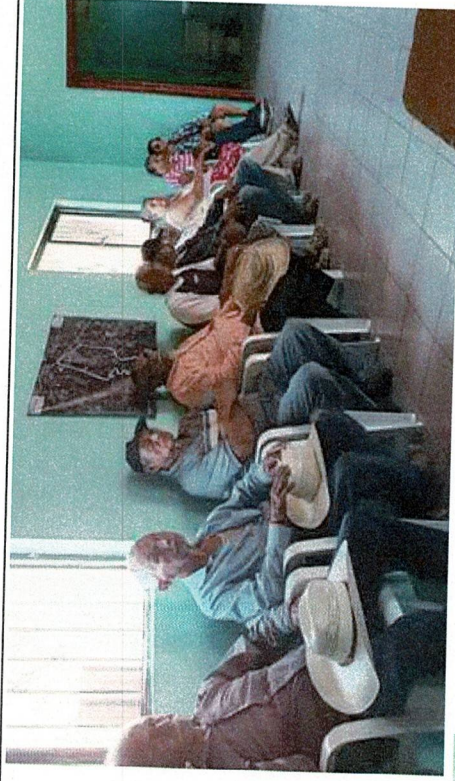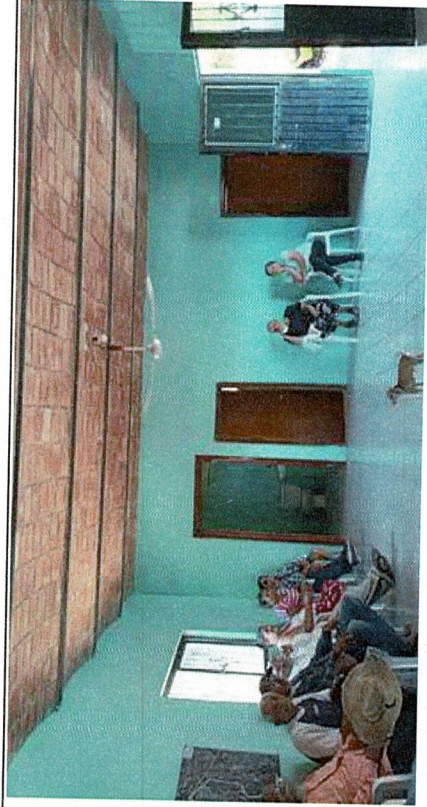

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO (PIE DE FOTOS)

10

Reunión: En coordinación con la regidora Dinoara se realizó una visita técnica para ver el estado actual de la calle Colosio en la localidad de Cuastecomate, para la realización de un proyecto de empedrado ahogado.

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE SAUCEDA MENDOZA

CAPTURISTA COMISIONADA A LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ

ING. JUAN JESÚS SALAS PULIDO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024 - 2027
